





Stadt Flörsheim am Main

Stadtwerke Flörsheim am Main

Sanierung der Altkönigstraße, Erzbergerstraße (Verbindung) und Bahnhofstraße

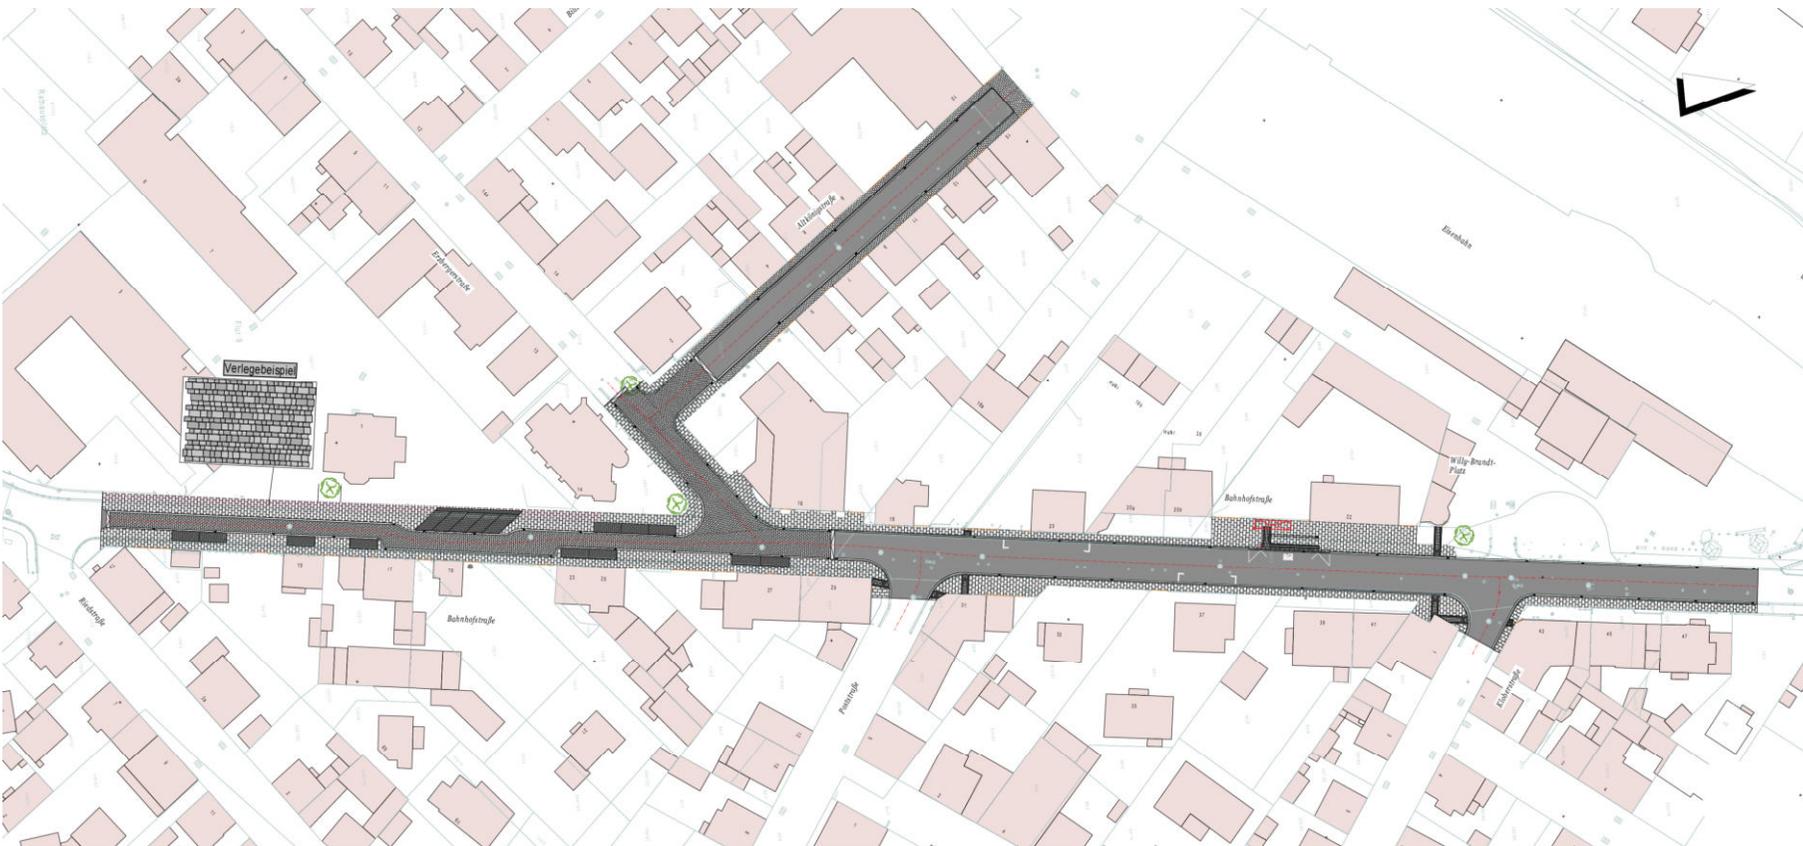

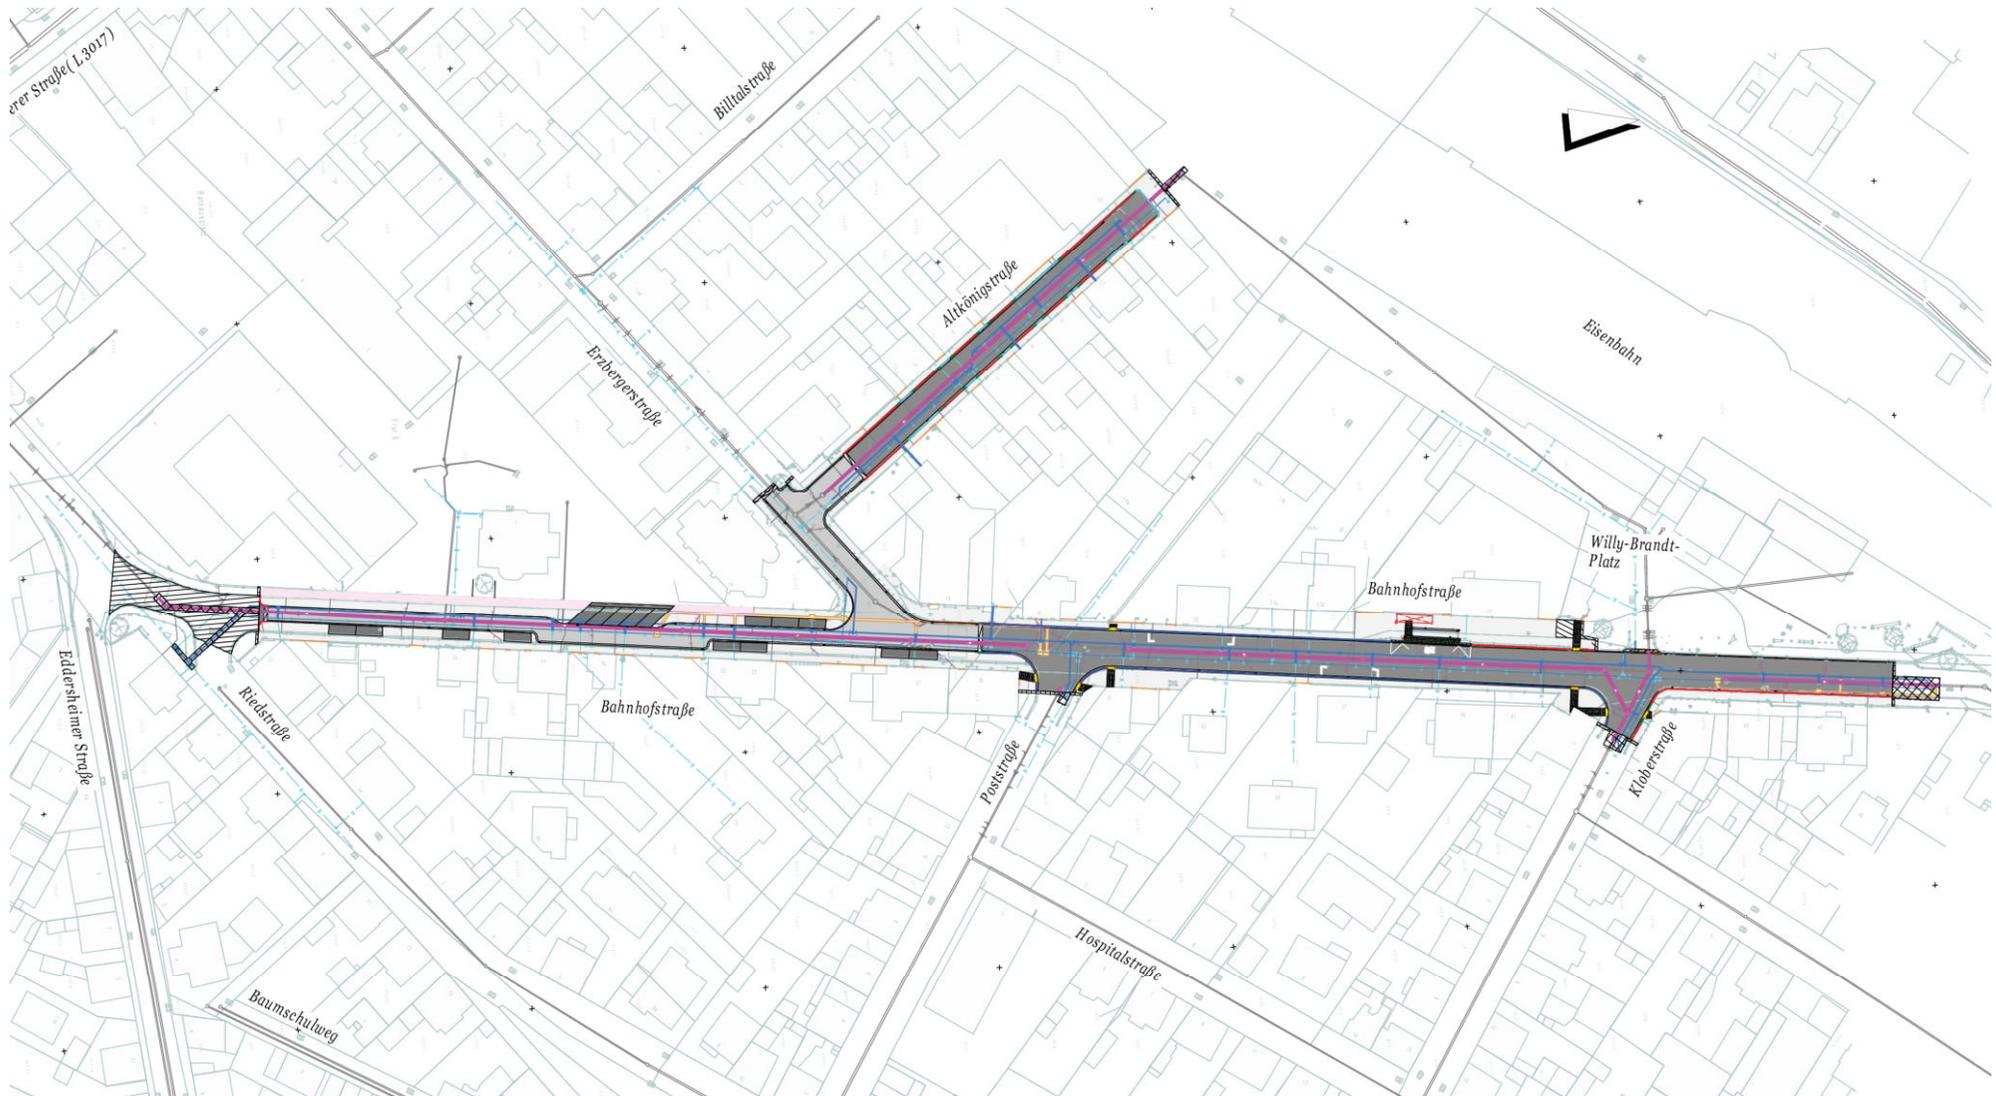

Ausbaubereich – derzeitige Situation




Ausbaubereich – derzeitige Situation




Ausbaubereich – derzeitige Situation




Straßenraumgestaltung

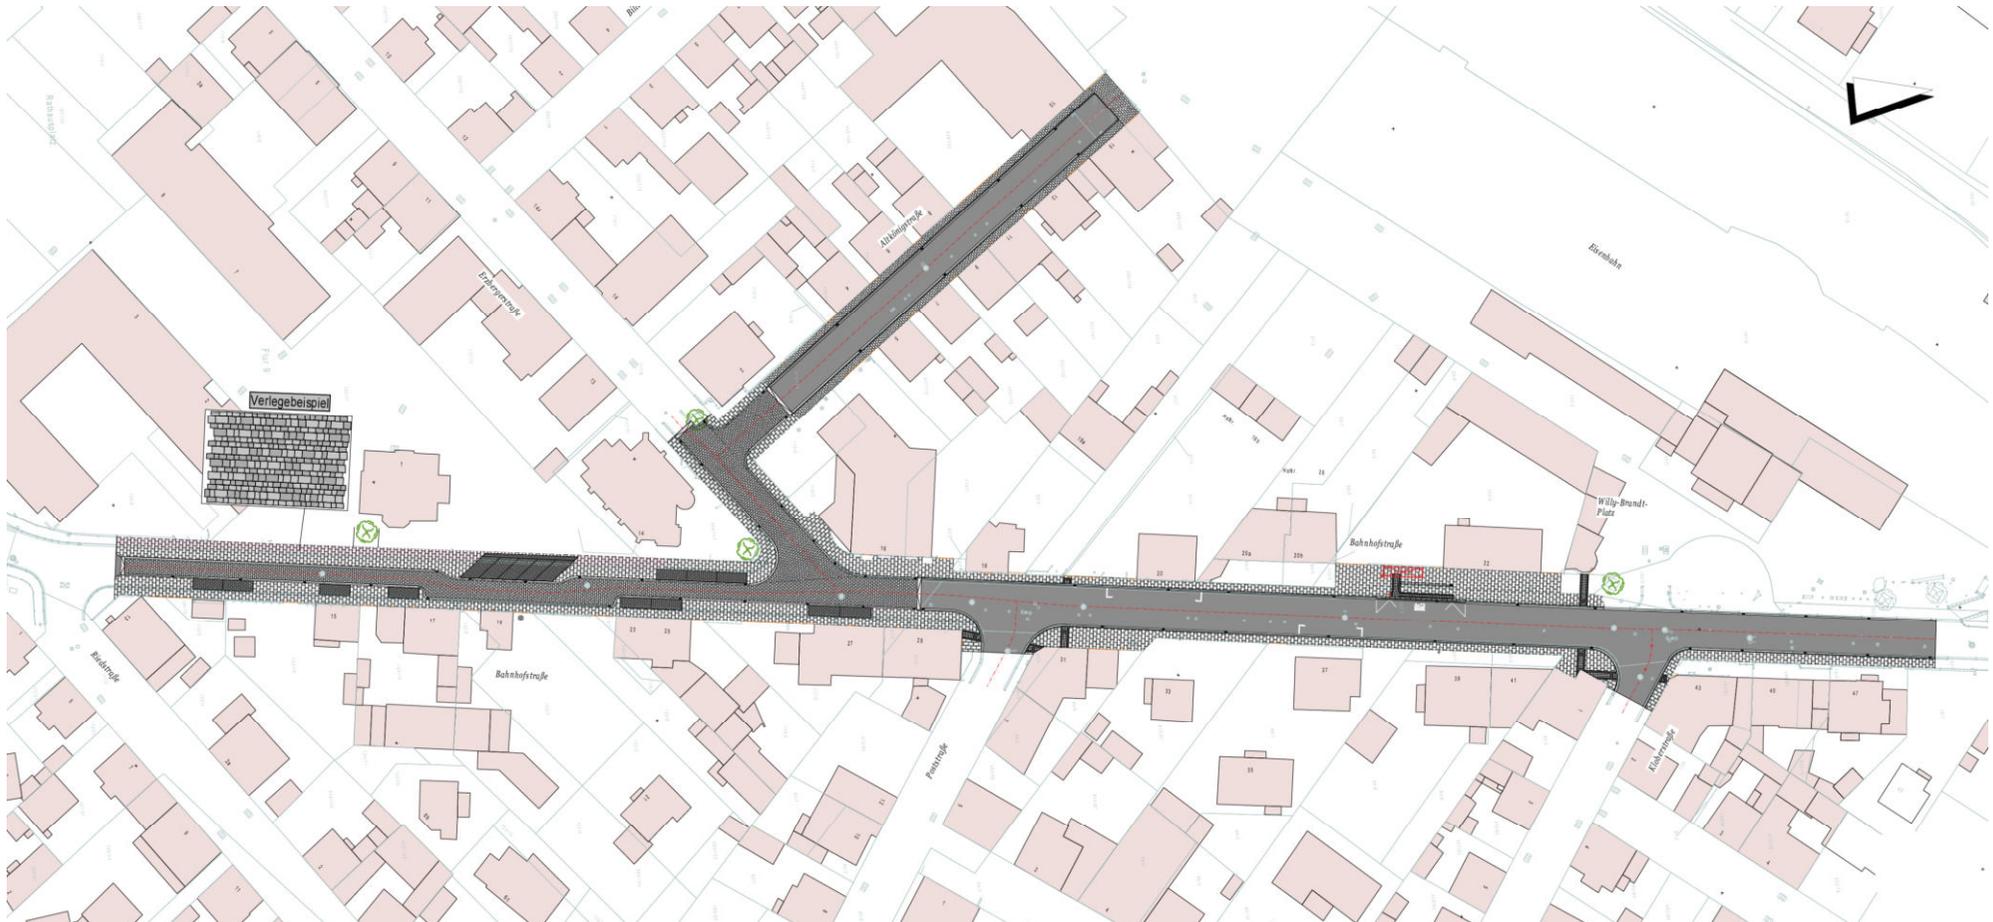


Übergang Asphaltfahrbahn / Mischfläche

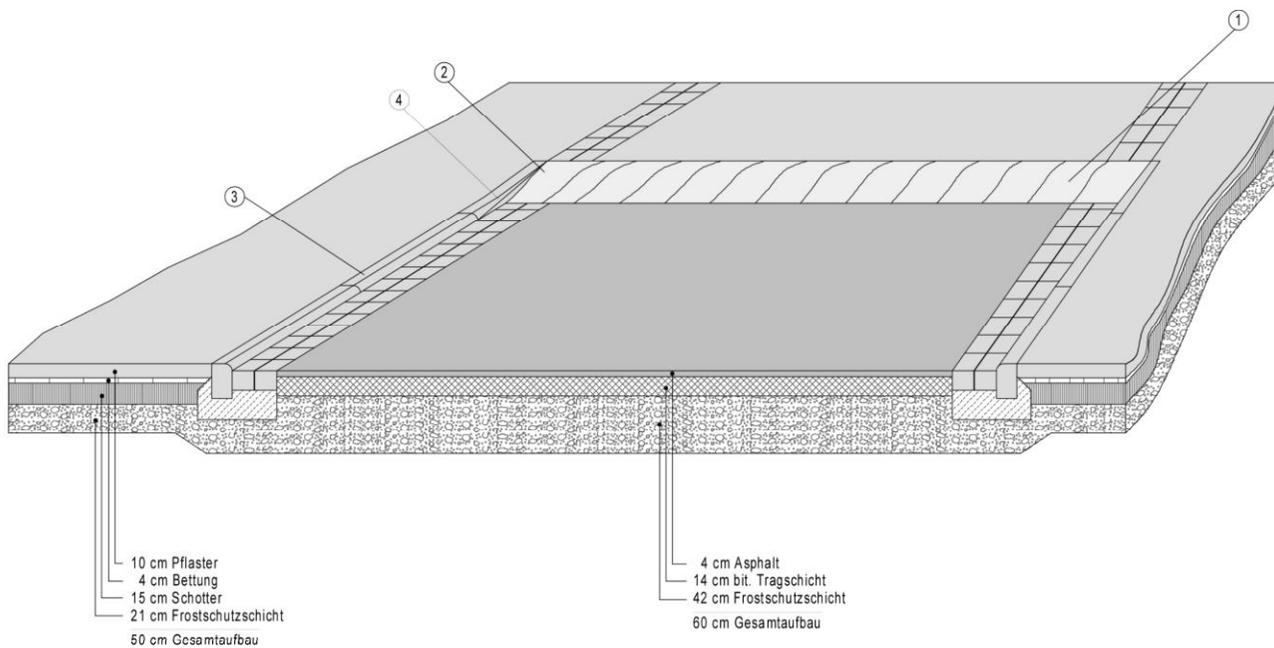

ZEICHENERKLÄRUNG

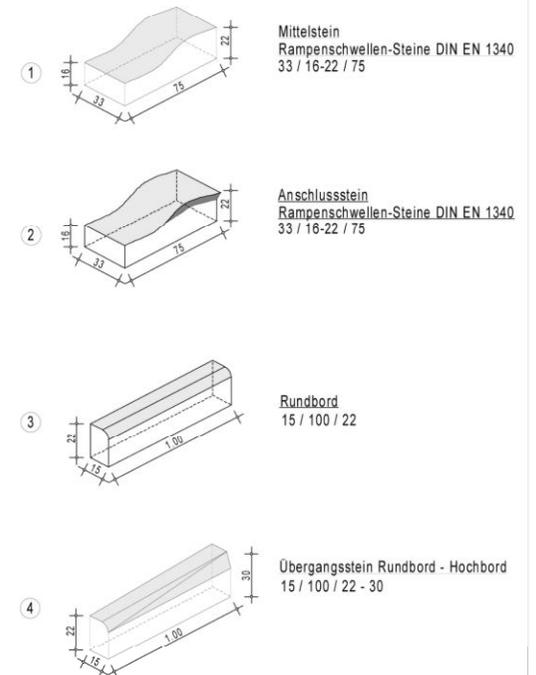


Bahnhofstraße Nord (Poststraße - Klobnerstraße / Bahnhofsvorplatz)

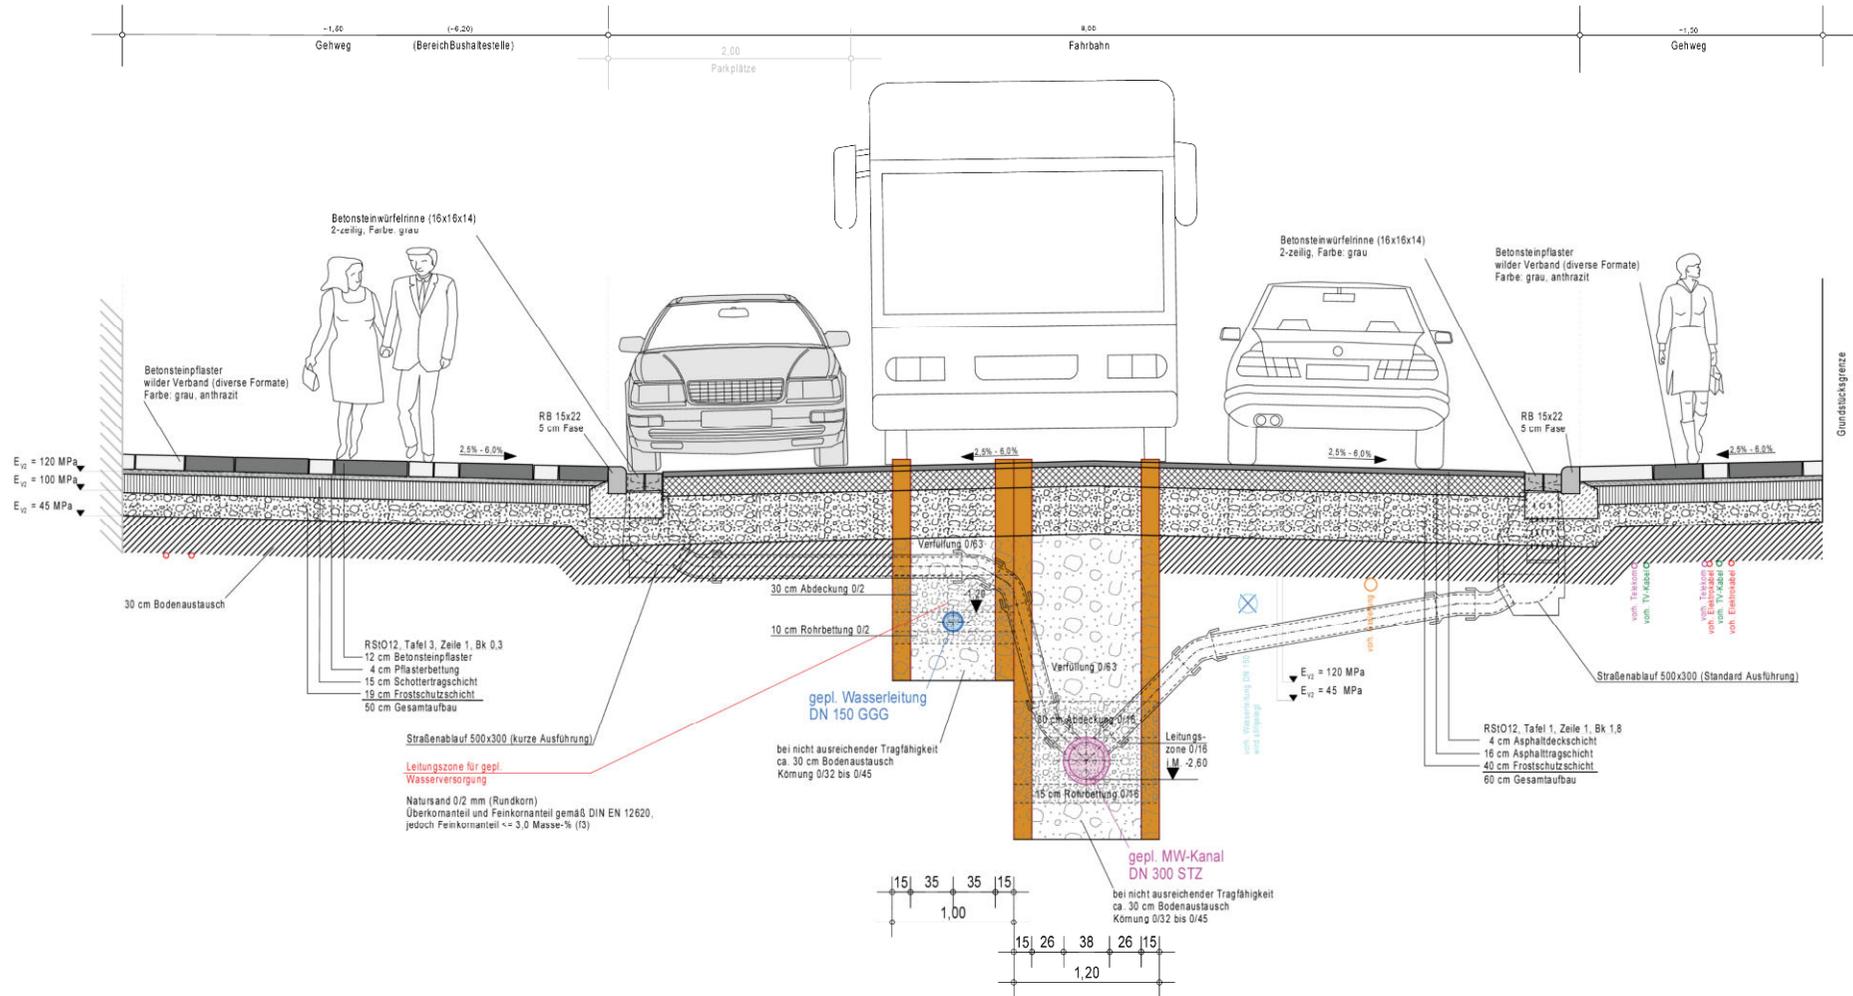


Ausbaubereich – derzeitige Situation




Altkönigstraße

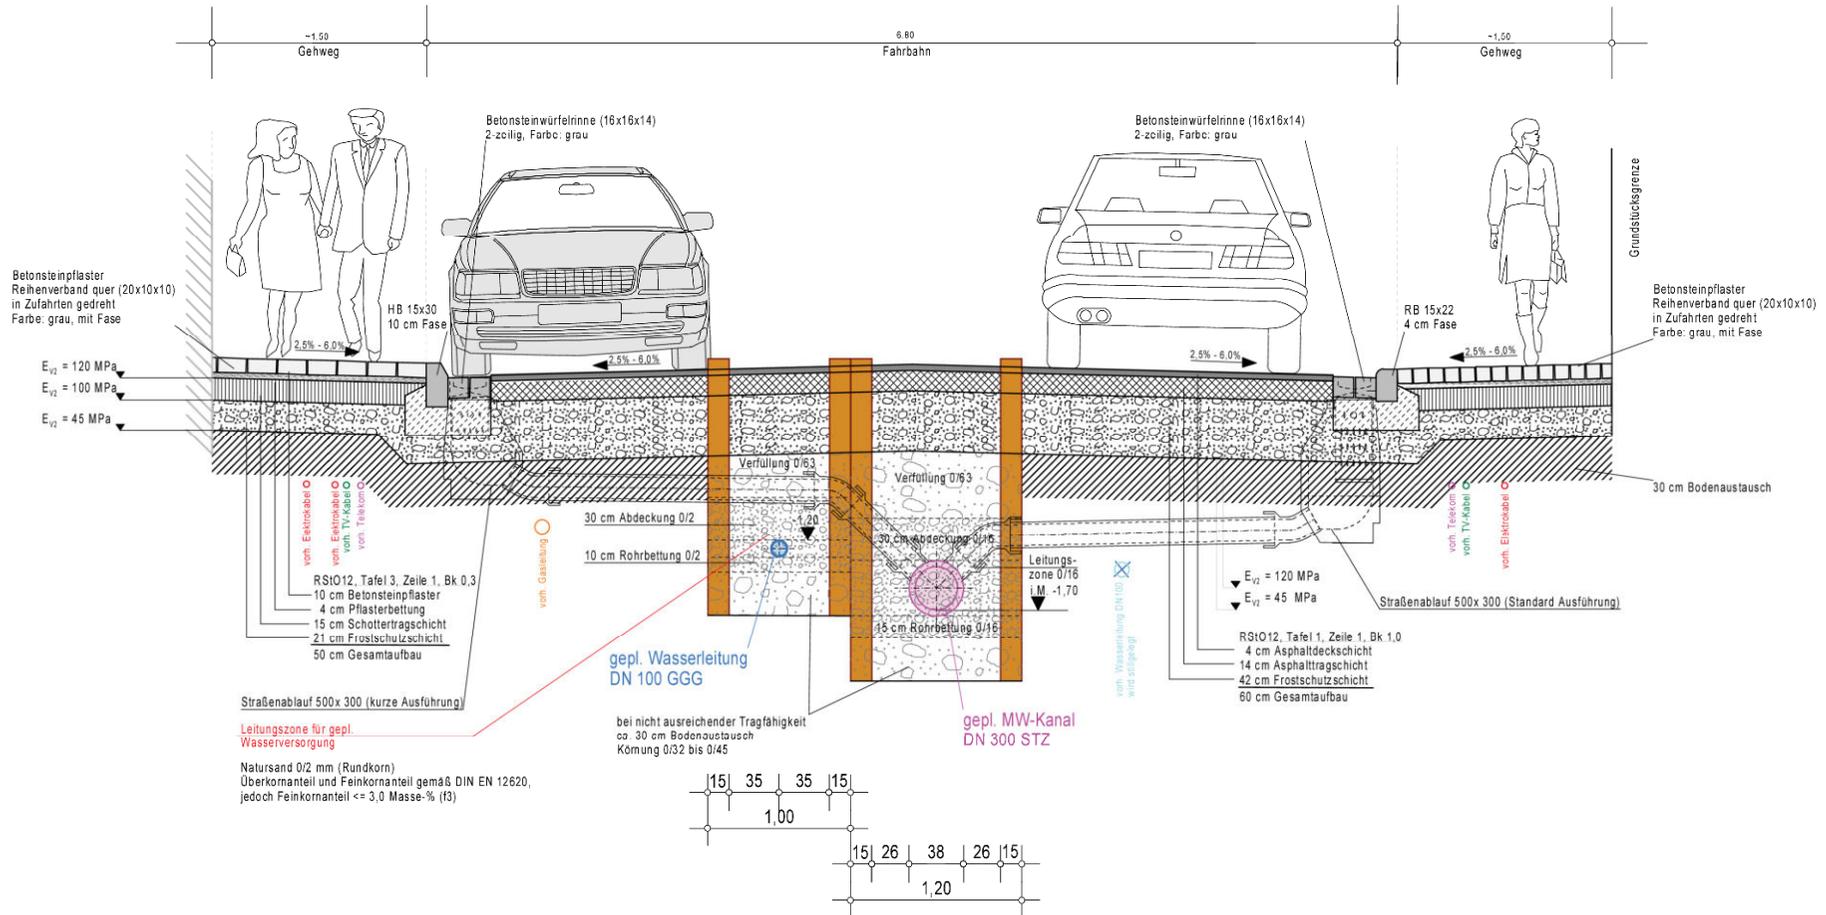


Ausstattung unbehinderte Mobilität

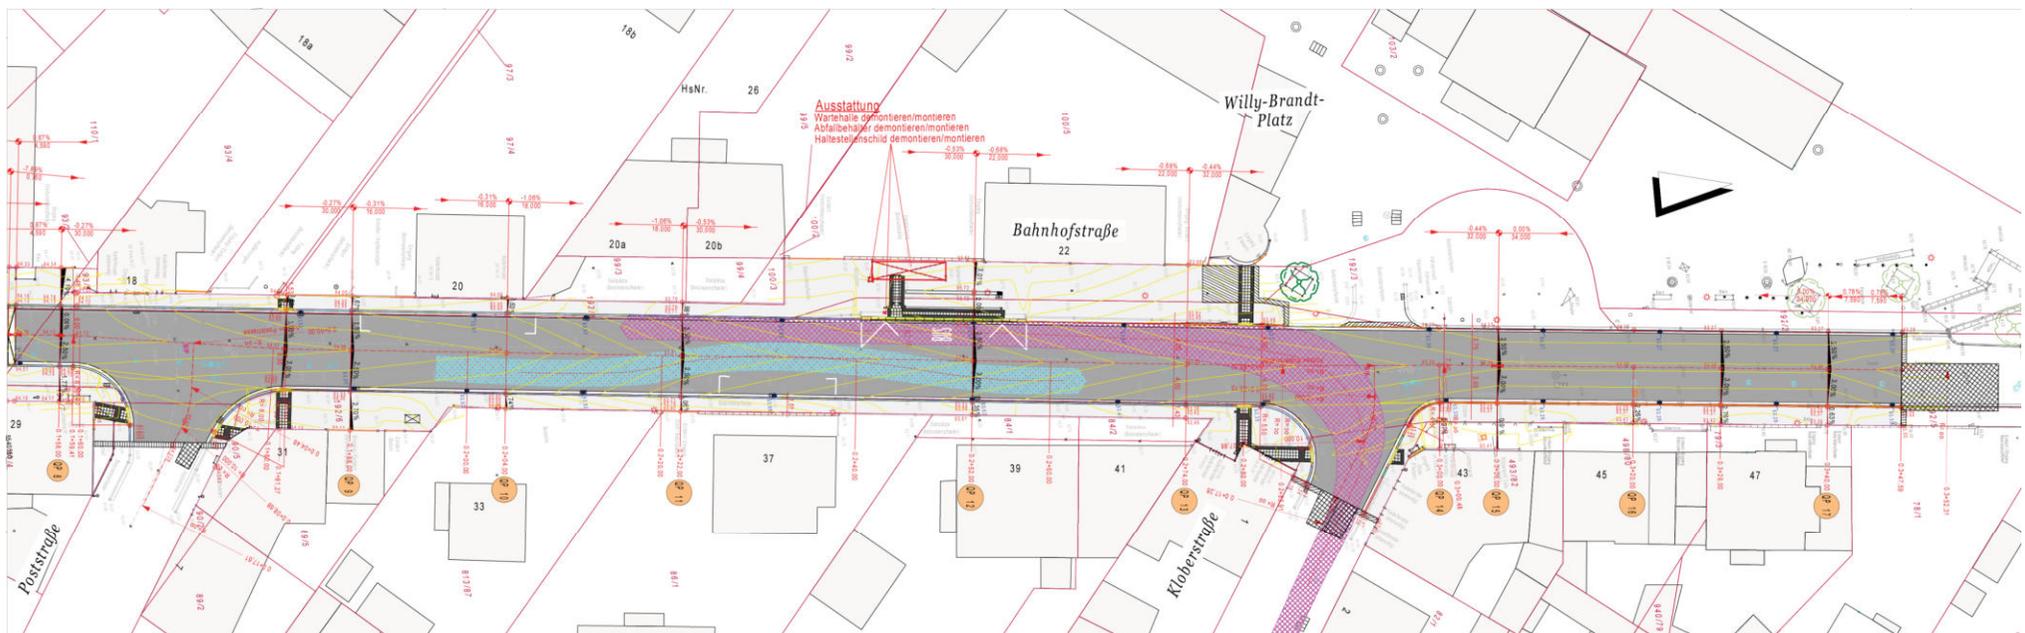


Systemplan gemeinsame ungesicherte Querungsstelle
gemäß DIN 32984 (Bodenindikatoren i. öff. Raum)

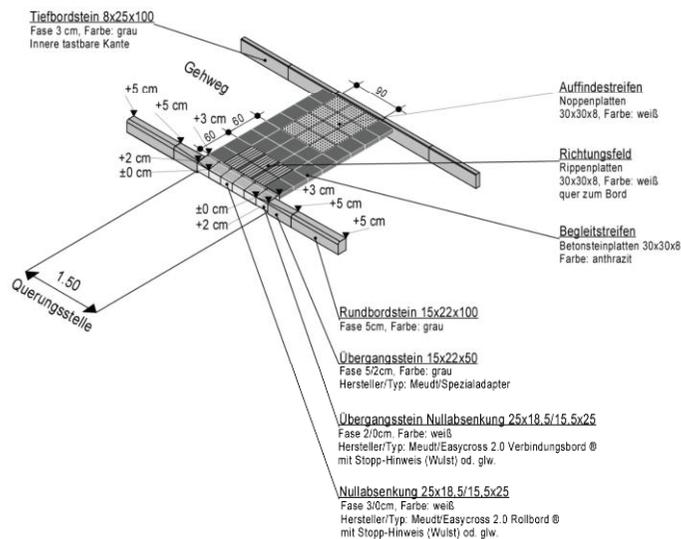

Systemplan Bushaltestelle
gemäß DIN 32984 (Bodenindikatoren i. öff. Raum)

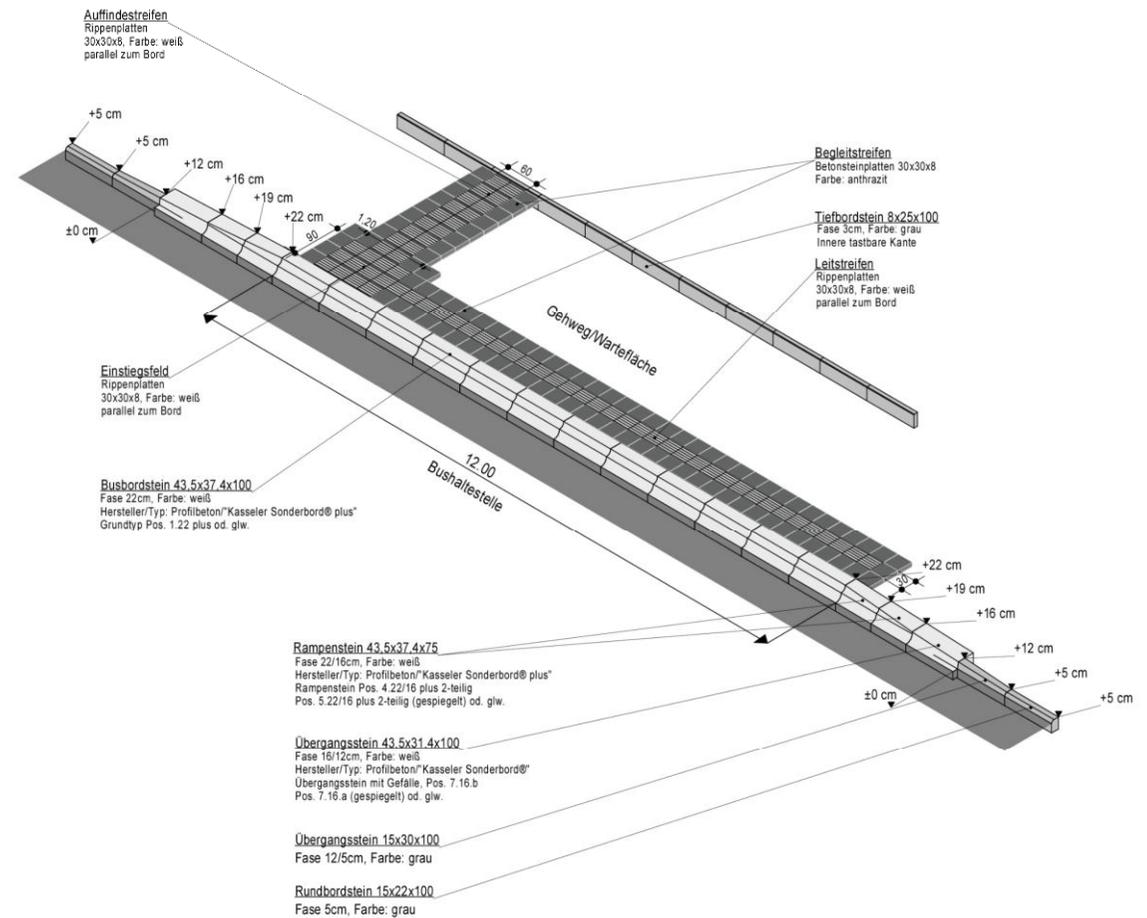

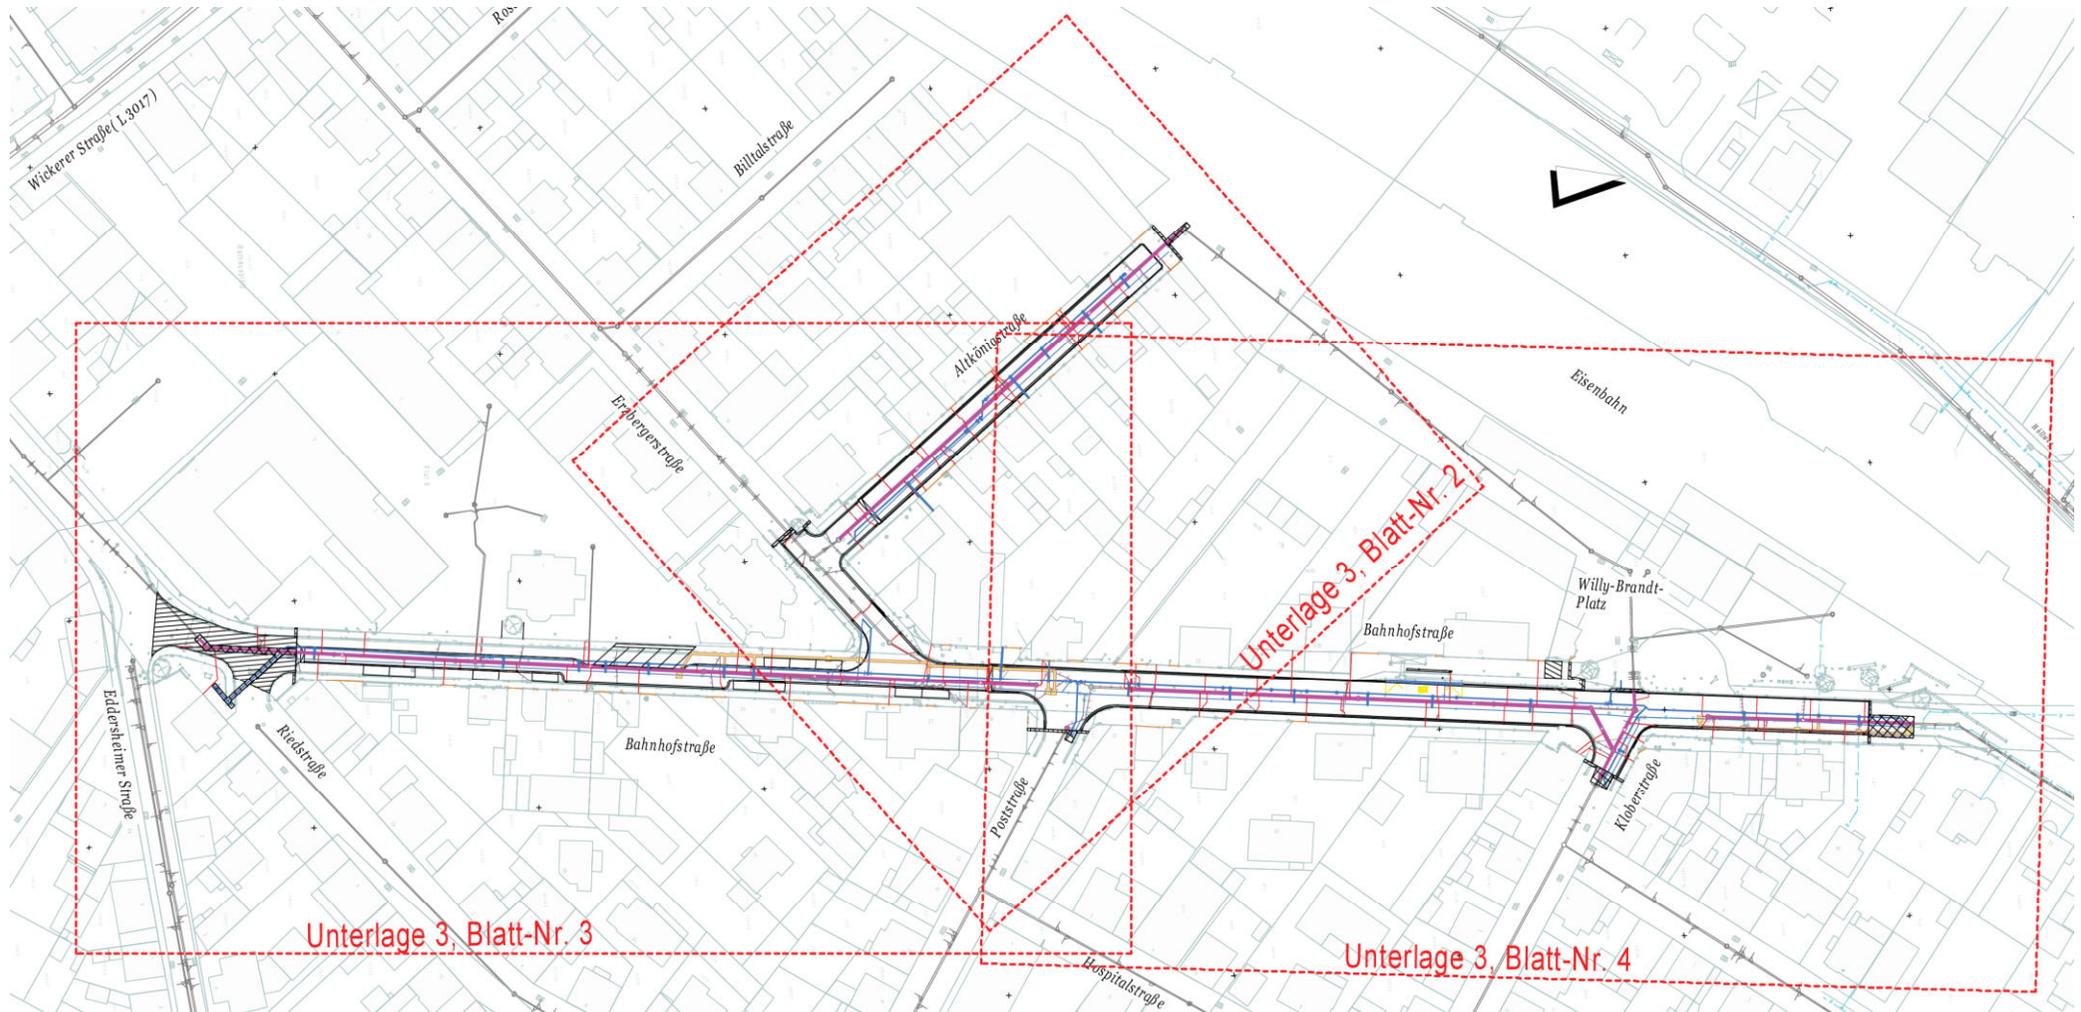

Erneuerung der Versorgungsleitungen

- Erneuerung der Hauptwasserleitung auf der gesamten Länge des Ausbaubereichs
- Die Wasserhausanschlussleitungen werden teilweise im öffentlichen Bereich und bei Handlungsbedarf bis zum Wasserzähler erneuert
- Gasleitung wird nicht erneuert. Einzelne Hausanschlüsse werden erneuert oder ergänzt
- Telekom- und Unitymedialeitungen werden nicht erneuert
- Stromleitungen werden nicht erneuert
- Erneuerung der Straßenbeleuchtung

1. BA - „Altkönigstraße“


Baubeginn: Ende Januar 2023

Bauzeit: rd. 15 Wochen

Bauende: Mitte Mai 2023

Fastnachtzug am 19.02.2023

- 120 m Kanalisation
- 17 St Kanal-Hausanschlüsse
- 110 m Wasserleitung
- 11 St Wasser-Hausanschlüsse
- 10 St Straßenabläufe
- Verkehrswegebau
- Straßenbeleuchtung

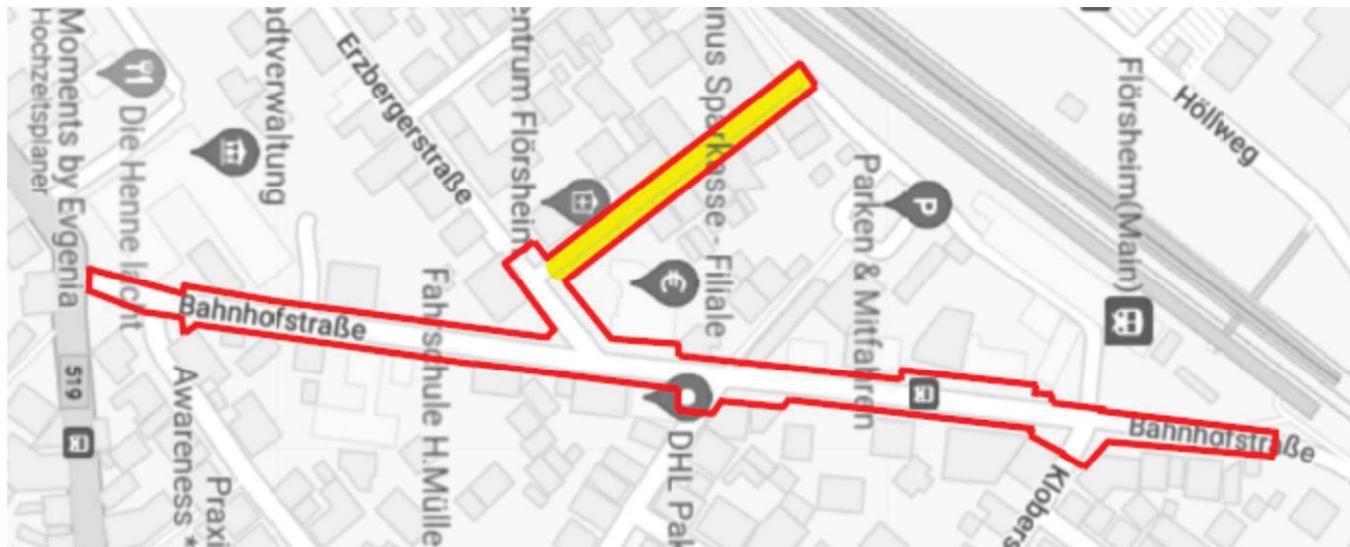


2. BA - „Erzbergerstraße / Bahnhofstraße Süd“

Baubeginn: Mitte Mai 2023

Bauzeit: rd. 31 Wochen

Bauende: Mitte Dezember 2023

- 190 m Kanalisation
- 18 St Kanal-Hausanschlüsse
- 220 m Wasserleitung
- 13 St Wasser-Hausanschlüsse
- 23 St Straßenabläufe
- Verkehrswegebau
- Straßenbeleuchtung

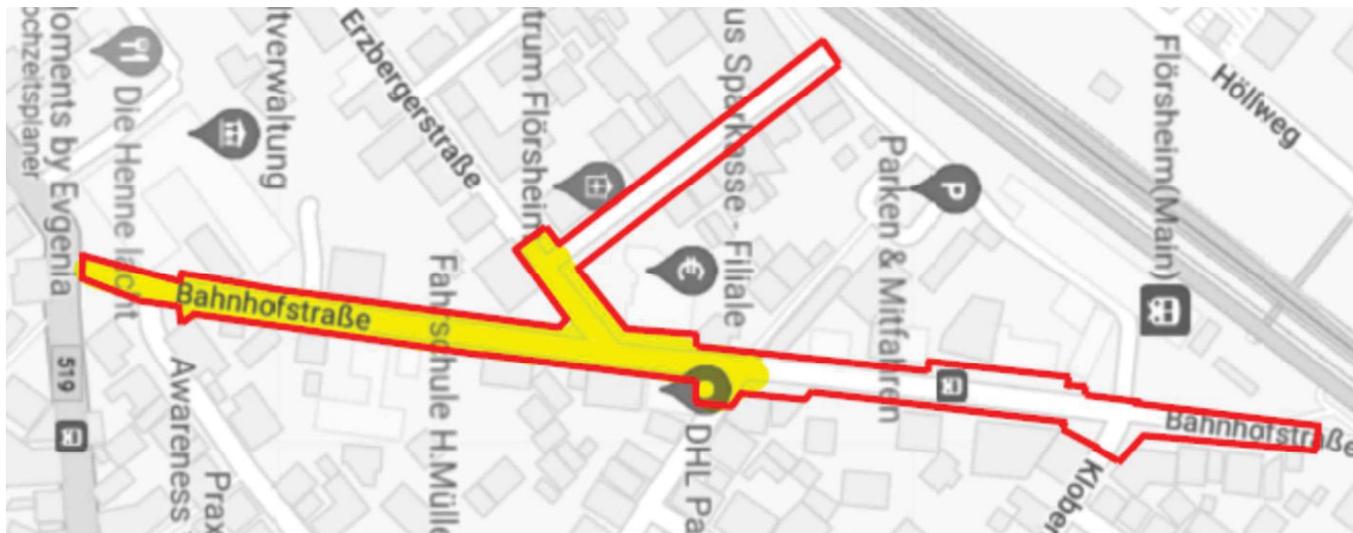

3. BA - „Kloberstraße - Bahnweg“


Baubeginn: Mitte Januar 2024

Bauzeit: rd. 9 Wochen

Bauende: Mitte März 2024

Fastnachtzug am 11.02.2024

- 45 m Kanalisation
- 3 St Kanal-Hausanschlüsse
- 60 m Wasserleitung
- 4 St Wasser-Hausanschlüsse
- Verkehrswegebau nur bis Frostschichtmaterial

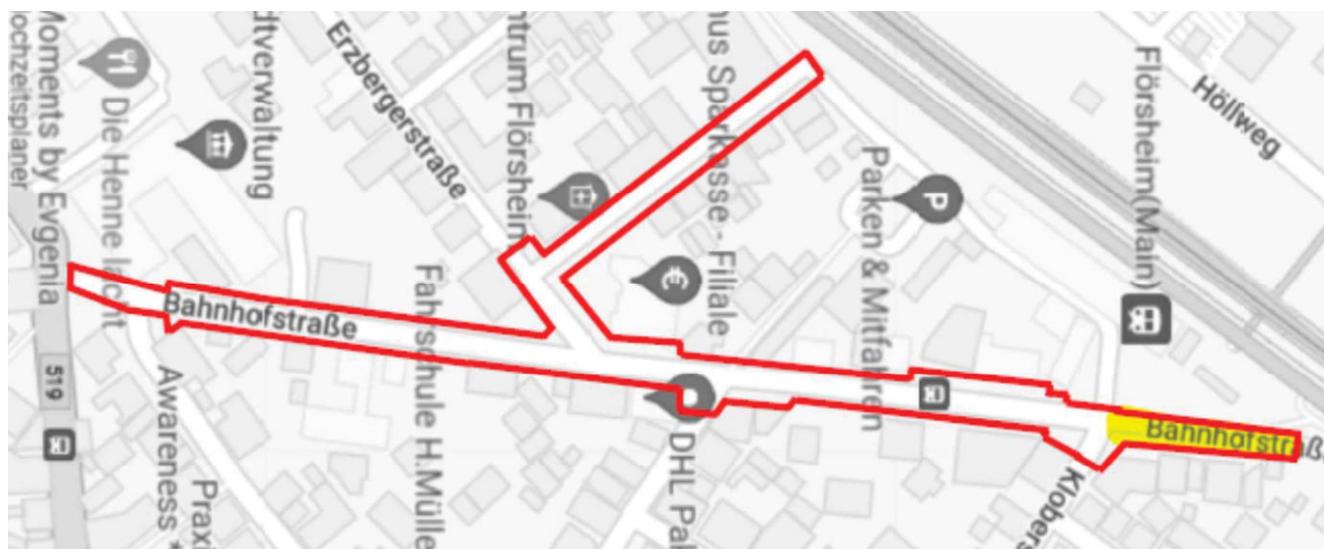


4. BA - „Bahnhofstraße Nord“

Baubeginn: Mitte März 2024

Bauzeit: rd. 19 Wochen

Bauende: Ende Juli 2024

- 130 m Kanalisation
- 12 St Kanal-Hausanschlüsse
- 140 m Wasserleitung
- 12 St Wasser-Hausanschlüsse
- 25 St Straßenabläufe einschl. 3.BA
- Verkehrswegebau einschl. 3.BA
- Straßenbeleuchtung einschl. 3.BA

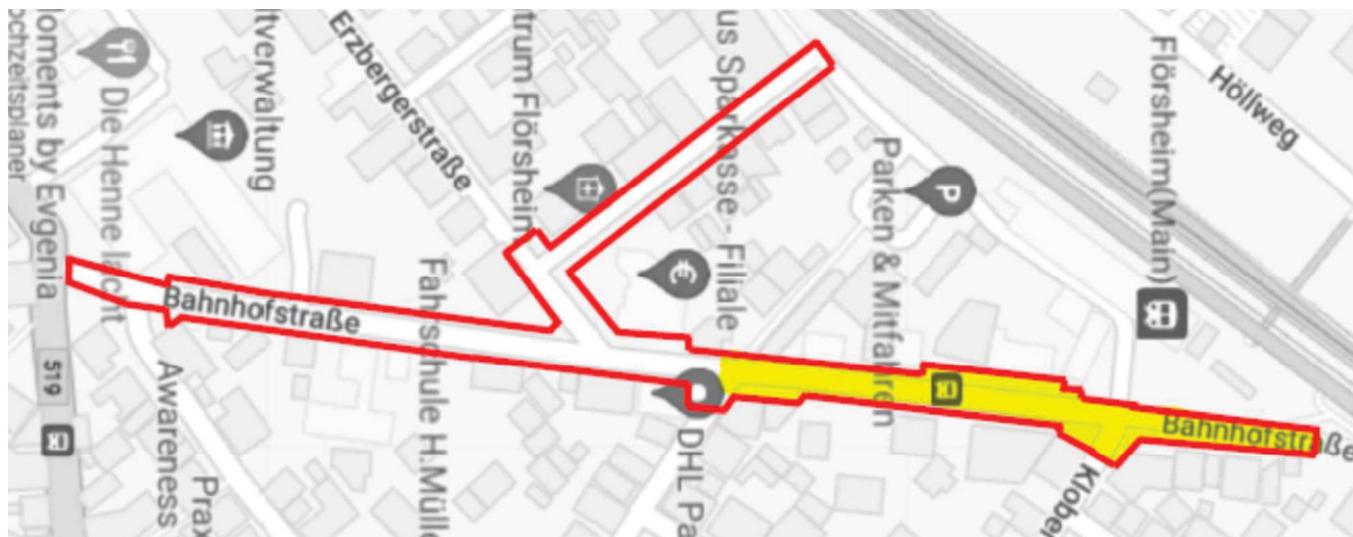



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
